




# R A P O R T

privind implementarea Planului de activitate pentru perioada  
ianuarie - iunie 2012

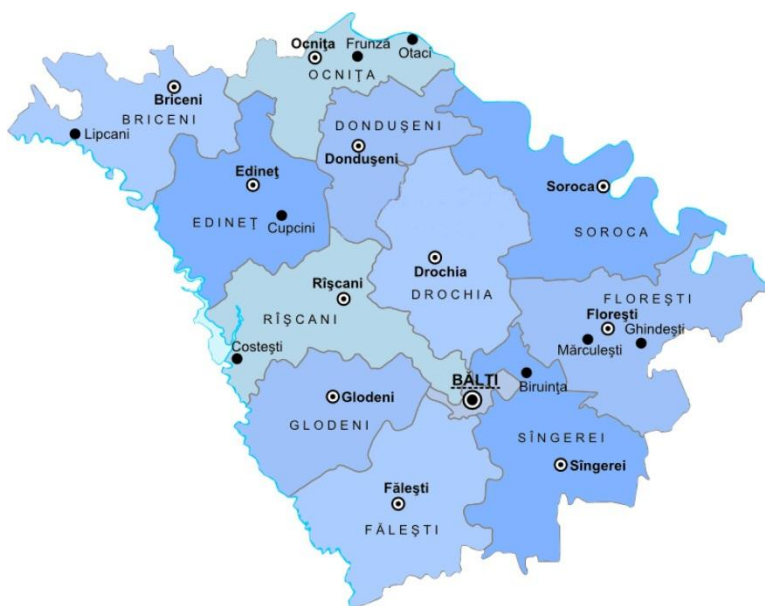

*Bălți, 2012*

## CUPRINS

<b>ABREVIERI</b> .....	2
<b>SUMAR EXECUTIV</b> .....	3
<b>I. Planificare strategică și programare</b> .....	4
1.1 Actualizarea SDR Nord .....	4
1.2 Actualizarea POR Nord.....	4
1.3 Elaborarea POR Nord 2013-2015.....	5
1.4 Monitorizarea și evaluarea SDR Nord și POR Nord.....	5
1.5 Facilitarea procesului de elaborare / actualizare a strategiilor de dezvoltare locală .....	6
<b>II. Identificarea, dezvoltarea și implementarea proiectelor regionale</b> .....	7
2.1 Acordarea asistenței actorilor regionali în dezvoltarea, identificarea și promovarea propunerilor de proiecte (PP) pe prioritățile SDR Nord .....	7
2.2 Desfășurarea APP II .....	9
2.3 Gestionarea și implementarea proiectelor regionale în 2012 din FNDR și din surse externe ...	10
<b>III. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali</b> .....	21
3.1 Dezvoltarea instituțională a ADR Nord.....	21
3.2 Informarea și instruirea membrilor CRD Nord.....	21
3.3 Facilitarea schimbului de experiență pentru membrii ADR Nord și CRD Nord.....	21
<b>IV. Comunicarea, promovarea și transparența</b> .....	22
4.1 Promovarea potențialului Regiunii Nord.....	22
4.2 Promovarea proiectelor implementate, conform priorităților SDR Nord .....	24
4.3 Îmbunătățirea comunicării cu APL, partenerii interni și externi .....	25
<b>V. Cooperarea cu partenerii de dezvoltare</b> .....	28
5.1 Cooperare cu partenerii regionali de dezvoltare .....	28
5.2 Cooperare cu partenerii internaționali de dezvoltare .....	28
5.3 Cooperare transfrontalieră.....	32
5.4 Schimb de experiență internațională.....	33
<b>VI. Activitatea operațională a ADR Nord</b> .....	35
6.1 Implementarea planului de achiziții al ADR Nord.....	35
6.2 Implementarea planului de finanțare al ADR Nord.....	36
<b>CONCLUZII</b> .....	37

## ANEXE

1. Nota informativă privind executarea bugetului ADR Nord în perioada ianuarie-iunie 2012
2. Executarea bugetului (cheltuieli și economii) pe surse de finanțare ale ADR Nord în perioada ianuarie-iunie 2012
3. Monitorizarea surselor de finanțare privind implementarea proiectelor pentru perioada ianuarie-iunie 2012
4. Lista indicatorilor de progres în dezvoltarea regională pentru perioada ianuarie-iunie 2012
5. Tabel de instruire al colaboratorilor ADR Nord

## ABREVIERI ȘI ACRONIME

<b>AAC</b>	– aprovizionarea cu apă și canalizare
<b>ADR Nord</b>	– Agenția de Dezvoltare Regională Nord
<b>AEE</b>	– Agenția pentru Eficiență Energetică
<b>APL</b>	– Administrația Publică Locală
<b>APP II</b>	– Apel de Propuneri de Proiecte II
<b>BD</b>	– Baza de Date
<b>CNCDR</b>	– Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale
<b>CRD Nord</b>	– Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord
<b>CF</b>	– Cerere de Finanțare
<b>SDR Nord</b>	– Strategia de Dezvoltare Regională Nord
<b>DFID</b>	– Departamentul pentru Dezvoltare Internațională al Marii Britanii
<b>DGDR</b>	– Direcția Generală Dezvoltare Regională
<b>DR</b>	– Dezvoltare Regională
<b>DUP</b>	– Documentul Unic de Program
<b>FNDR</b>	– Fondul Național pentru Dezvoltare Regională
<b>GIZ</b>	– Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei
<b>GL</b>	– Grup de Lucru
<b>JTS</b>	– Secretariatul Tehnic Comun
<b>NC</b>	– Notă Conceptuală
<b>MAE</b>	– Ministerul Afacerilor Externe
<b>M&amp;E</b>	– Monitorizarea și Evaluarea
<b>MDRC</b>	– Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
<b>MO</b>	– Manualul Operațional
<b>ONG</b>	– Organizație neguvernamentală
<b>ODIMM</b>	– Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii
<b>PAA</b>	– Planul Anual de Activitate al ADR Nord
<b>PAI</b>	– Planul Anual de Implementare a SNDR
<b>POC</b>	– Programul Operațional Comun
<b>POR Nord</b>	– Planul Operațional al Regiunii Nord
<b>RDN</b>	– Regiunea de Dezvoltare Nord
<b>SIDA</b>	– Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională
<b>SNDR</b>	– Strategia Națională de Dezvoltare Regională
<b>UAT</b>	– Unități Administrativ Teritoriale
<b>ZEL</b>	– Zona Economică Liberă

## SUMAR EXECUTIV

Prezentul raport privind implementarea PAA al ADR Nord vizează **perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012.**

Raportul pentru semestrul I al ADR Nord reflectă toate activitățile instituționale ale Agenției, activitățile procesului de dezvoltare regională, de suport în elaborarea și promovarea proiectelor regionale, de asigurare a transparenței decizionale și financiare în conformitate cu PAA al ADR Nord pentru anul 2012, cadrul normativ al dezvoltării regionale, Planului de activitate al DGDR a MDRC, SNDR și SDR Nord și reieșind din *obiectivele principale* pentru anul 2012:

- Actualizarea documentelor de politici regionale de dezvoltare: SDR Nord și POR Nord;
- Monitorizarea implementării politicilor regionale de dezvoltare;
- Implementarea proiectelor regionale;
- Dezvoltarea capacităților actorilor regionali în elaborarea strategiilor / planurilor și proiectelor regionale;
- Promovarea potențialului socio-economic al RDN.

În perioada de raportare, ADR Nord a realizat politica de dezvoltare regională prin implementarea programelor și proiectelor din POR Nord, cu suport financiar din FNDR și al partenerilor de dezvoltare, obținând rezultate în urma implementării activităților planificate prin revizuirea capitolelor SDR Nord, actualizarea POR Nord 2010-2012 și elaborarea conceptului nou al POR Nord 2013-2015. De asemenea, prin organizarea a 2 ședințe CRD Nord, a 2 seminare informativ instructive pentru membrii CRD și alte 17 sesiuni de instruire și de informare pentru circa 346 actori regionali, precum și a Forumului Economic Interregional Moldo-Român, care a întrunit peste 200 de antreprenori din RDN și Regiunea Vest, România.

Cu succes s-a desfășurat și APP II, în cadrul căruia s-au desfășurat sesiuni de informare pentru cca 200 de persoane în trei microregiuni și care s-a soldat cu 55 de note conceptuale ale proiectelor depuse, 19 din ele fiind aprobate de către CRD Nord pentru etapa II a APP.

În perioada de raportare, ADR Nord a efectuat activități de implementare a 134 de proiecte regionale, dintre care 10 sînt cu finanțare din sursele FNDR, 2 proiecte – din sursele GIZ și 1 proiect finanțat de Ambasada Republicii Cehe; 1 proiect a fost finalizat în primul trimestru al anului.

Pentru consolidarea capacităților și crearea noilor parteneriate, specialiștii ADR Nord au participat la 4 vizite de studiu în străinătate.

Prin urmare, putem afirma că activitățile planificate pentru semestrul I al anului 2012 au fost realizate integral.

## I. Planificare strategică și programare

### 1.1. Actualizarea SDR Nord

Unul dintre principalele obiective ale ADR Nord pentru anul 2012 este actualizarea SDR Nord, în baza datelor statistice pe regiune, prin corelarea ei cu strategiile sectoriale prioritare politicii naționale de dezvoltare regională, inclusiv și cu Planul Național pentru Eficiența Energetică pentru anii 2012-2020, precum și cu strategiile / planurile de dezvoltare socio-economică ale APL din RDN, dat fiind faptul că planificarea dezvoltării regionale este strâns legată de politicile naționale și necesitățile locale, reflectate în planurile sale de dezvoltare locală (raională).

Actualizarea SDR Nord se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici și întrunește următoarele etape realizate în semestrul I din 2012:

- *Studiul politicilor sectoriale naționale* și elaborarea propunerilor de corelare a SDR Nord cu politicile naționale de dezvoltare în domeniile prioritare strategiei;
- *Stabilirea metodologiei de actualizare*, în cadrul ședințelor grupului de lucru cu participarea specialiștilor MDRC și ADR.
- *Prezentarea metodologiei și procesului de actualizare a SDR* în cadrul ședinței comune de la MDRC cu participarea partenerilor de dezvoltare internaționali din Letonia, Cehia, Franța, România etc.
- *Vizita experților letoni la ADR Nord*, unde s-au stabilit planul de acțiuni privind actualizarea SDR Nord și organizarea vizitei de studiu în Letonia.
- *Colectarea datelor necesare pentru actualizarea SDR Nord în domeniile prioritare SDR și eficienței energetice*, pentru fundamentarea măsurilor SDR Nord și stabilirea indicatorilor de performanță. Datele acumulate vor fi utilizate și în procesul de actualizare / elaborare și a strategiilor raionale din RDN.

În semestrul II din 2012, urmînd activitățile de formulare a obiectivelor specifice conform priorităților SDR, urmează să se realizeze următoarele: stabilirea indicatorilor de monitorizare a obiectivelor, formularea obiectivelor de dezvoltare pe termeni mediu (generale și specifice), elaborarea capitolului nou privind situația actuală în domeniul eficienței energetice a instituțiilor publice din RDN, consultarea proiectului SDR Nord actualizat în cadrul a 3 microregiuni și aprobarea SDR Nord actualizat de către CRD Nord.

### 1.2. Actualizarea POR Nord 2010-2012

Actualizarea POR Nord 2010-2012 a avut loc după revizuirea proiectelor selectate în Primul Apel de Propuneri de Proiecte (27 proiecte din 28 proiecte), dintre care 20 de proiecte au

fost înaintate de CRD Nord spre aprobare CNCDR la prima ședință din 19.01.2012, în baza deciziei nr. 5/2 din 19.01.2012, cu privire la actualizarea POR Nord. 7 proiecte au fost aprobate spre finanțare în 2012.

### **1.3. Elaborarea POR Nord 2013-2015**

În semestrul I din 2012, ADR Nord a realizat o serie de activități în scopul elaborării POR Nord 2013-2015:

- Definitivarea structurii, metodei și planului de elaborare a POR Nord în cadrul ședințelor comune cu specialiștii MDRC, ADR și consultanților GIZ;
- Colectarea și analiza datelor necesare pentru elaborarea POR Nord;
- Elaborarea capitolelor POR Nord, conform noii structuri;
- Crearea grupurilor de lucru specializate, conform priorităților / măsurilor SDR Nord.

În semestrul II se vor organiza ședințele grupurilor de lucru specializate în stabilirea obiectivelor și indicatorilor regionali în domeniile prioritare SDR Nord și cel al eficienței energetice a clădirilor publice, conform proiectelor selectate și aprobate de CRD în cadrul APP II, pentru a fi incluse în POR, elaborarea notelor informative la proiectele aprobate, definitivarea proiectului POR 2013-2015 prin stabilirea activităților de implementare POR Nord, consultarea proiectului POR 2013-2015 și aprobarea POR 2013-2015 de CRD Nord.

### **1.4 Monitorizarea și evaluarea SDR Nord și POR Nord**

Conform cerințelor MO și indicațiilor MDRC, au fost elaborate și prezentate, săptămânal / lunar / trimestrial, rapoarte privind etapele de actualizare a SDR Nord, POR Nord, precum și rapoartele privind realizarea planurilor de activitate pentru anul 2012 în perioada ianuarie-iunie 2012, rapoartele lunare privind valorificarea bugetului proiectului individual pe fiecare proiect în parte, rapoartele trimestriale privind monitorizarea proiectului individual, rapoartele trimestriale privind monitorizarea mijloacelor financiare.

De asemenea, la solicitarea structurilor MDRC s-au elaborat și remis planuri lunare și trimestriale de activitate a ADR Nord.

Pe parcursul semestrului I din 2012, ADR Nord a asigurat buna organizare a 4 ședințe a biroului executiv din cadrul CRD Nord și 2 ședințe a CRD Nord, din 19.01.2012 și 18.05.2012, soldate cu 10 decizii (7 și 3).

### **1.5 Facilitarea procesului de elaborare / actualizare a strategiilor de dezvoltare raională**

Cu suportul specialiștilor ADR Nord și GIZ, CR Rîșcani a fost asistat la definitivarea capitolului AAC a SDSE a raionului Rîșcani. În acest scop, s-au organizate 2 mese rotunde cu grupul de planificare locală, în cadrul cărora experții GOPA au propus spre consultare soluții

pentru alimentarea cu apă a raionului Rîșcani, inclusiv și planul concret de acțiuni privind AAC a raionului.

De asemenea, s-a redactat manualul cu descrierea întregului proces de actualizare la capitolului AAC din SDSE a raioanelor Rîșcani și Cahul și a metodologiei aplicate, care va fi editat și diseminat în toate raioanele din Moldova (pentru detalii, a se vedea *paragraful 5.2 – Cooperare cu partenerii de dezvoltare*).

## II. Identificarea, dezvoltarea și implementarea proiectelor regionale

### 2.1. Acordarea asistenței actorilor regionali în dezvoltarea, identificarea și promovarea propunerilor de proiecte (PP) pe prioritățile SDR Nord

#### 2.1.1. Dezvoltarea și facilitarea procesului de elaborare și îmbunătățire a proiectelor din POR 2010-2012

În perioada ianuarie-februarie 2012, pentru beneficiarii ale căror proiecte sînt incluse în POR Nord 2010-2012 s-au acordat servicii de consultanță, în scopul îmbunătățirii acestora prin organizarea vizitelor în teren (or. Lipcani, s. Corjeuți, com. Larga r-nul. Briceni, or. Sîngerei) și organizarea întrunirilor cu aplicanții proiectelor, consultanțe și ședințe de lucru în cadrul ADR cu aplicanții din or. Edineț, com. Tătărauca Veche, r-nul Soroca, în scopul îmbunătățirii proiectelor regionale aflate în DUP (10 ședințe de lucru și 20 persoane consultate).

În rezultatul ședinței CNCDR din 23.02.2012, au fost acceptate spre finanțare 4 proiecte noi din DUP. Astfel, proiectele care constituie POR 2010-2012 (*27 la număr*) se divizează în:

- Proiecte incluse în DUP 2010-2012 din RDN (*19 unități, dintre care 11 proiecte sînt în curs de implementare, 1 proiect este finalizat*);
- Proiecte rămase în POR 2010-2012 (*8 unități*).

#### ***Propuneri de proiecte acceptate spre finanțare din FNDR: 11***

Conform deciziei CNCDR nr. 5/12 din 23.02.12, în anul 2012 au fost aprobate 4 proiecte noi spre finanțare, pentru care a fost alocată suma de 34 744,6 mii lei.

1. „Reparația sectorului de drum local L-37 „Lipcani-Balasinești-Corjeuți-Tîrnova”, s. Corjeuți, r-nul Briceni, **suma aprobată 13 489,2 mii lei**;
2. „Intersecții Culturale” s. Băhrinești, r-nul Florești, **suma aprobată 1 255,4 mii lei**;
3. „Reabilitarea rețelei de drum public local Pîrlița-Dumbrăveni-Vădeni-Florești”, CR Soroca, **suma aprobată 10 000 mii lei**;
4. „Finalizarea construcției apeductului magistral Bălți-Sîngerei cu ramificații comunitare”, CR Sîngerei, **suma aprobată 10 000 mii lei**.

#### ***Propuneri de proiecte acceptate spre finanțare din sursele GIZ: 1 proiect.***

1. „Aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, com. Costești, raionul Rîșcani”, **suma totală 2 286,5 mii lei**;

#### 2.1.2. Identificarea ideilor de proiecte regionale din RDN

În continuarea activităților din 2011 privind identificarea necesităților și a ideilor de proiecte în cadrul diverselor activități de instruire a APL de nivelul I și II, în domeniul scrierii



proiectelor pentru FNDR și UE, în anul 2012 s-a lucrat asupra dezvoltării ideilor și facilitării procesului de elaborare a proiectelor cu impact regional și transfrontalier în baza acestor idei. Astfel, din cele 34 de idei de proiecte au fost dezvoltate și depuse în cadrul APP II 7 NC.

În ceea ce privește ideile de proiecte pentru fondurile UE, s-au petrecut 3 sesiuni de informare pe microregiuni (mun. Bălți, or. Soroca, or. Edineț), cu participarea bordului JTS din România și RM, în cadrul cărora potențialii beneficiari din cadrul APL I și II au fost informați atât cu privire la completarea Cererilor de Finanțare (CF), cât și despre regulamentul de depunere a acestora. Participanții au primit setul de materiale privind Programul RO-UA-MD.

În perioada ianuarie-februarie, ADR Nord a acordat 4 consultanțe (APL Vădeni, r-nul Soroca, CR Edineț, APL Cremenciug, r-nul Soroca) privitor la completarea CF pentru Programul RO-UA-MD 2010-2013. În urma chestionării actorilor din RDN, s-a constatat că au fost dezvoltate și depuse 5 note conceptuale pentru acest programul.

De asemenea, în cadrul activităților de informare și a altor evenimente organizate de ADR Nord, potențialii beneficiari (APL, ONG și sectorul privat din regiune) au fost informați despre posibilitățile de aplicare la diverse programe naționale și internaționale cum ar fi FNDR, Programe UE (POC 2010-2013), programe finanțate din sursele Ambasadei Republicii Cehe, MAE.

### *2.1.3 Promovarea PP regionale din RDN în cadrul comunității donatorilor*

Reieșind din faptul că sursele financiare oferite din FNDR pentru implementarea proiectelor regionale sînt insuficiente, este necesară atragerea de fonduri suplimentare externe pentru implementarea proiectelor cu impact regional, proiecte care au fost incluse în POR Nord / DUP, numărul cărora se va mări considerabil după APP II.

Astfel, în rezultatul aplicării către Ambasada Republicii Cehe a unor propuneri de proiecte din RDN, în 2012 a fost selectat proiectul **„Analiza cost-beneficiu – instrument necesar pentru implementarea proiectelor investiționale de anvergură”** (în valoare de 5 943 de euro), care este o continuitate a proiectului acceptat spre finanțare, din aceeași sursă, în 2011 – *„Importanța studiilor de fezabilitate în consolidarea procesului de dezvoltare regională în Republica Moldova”* (în valoare de 8 129,50 de euro).

De asemenea, ADR Nord a facilitat elaborarea și depunerea a 3 NC din RDN către programe finanțate din sursele Ambasadei Republicii Cehia pentru beneficiarii din or. Otaci, or. Fălești și or. Edineț.

## **2.1. Desfășurarea Apelului Propunerilor de Proiecte (APP) II**

### *2.2.1 Informarea APL I, II privind criteriile de eligibilitate pentru APP II*


MDRC a lansat APP II în data de 27 martie 2012. ADR Nord a contribuit la buna organizare și desfășurare a evenimentului, realizat conform etapelor și cerințelor elaborate de MDRC, pentru a asigura un proces transparent, echidistant și funcțional. În acest sens:

- A fost publicată informația privind APP II pe site-ul ANR Nord ([www.adrnord.md](http://www.adrnord.md)) ș.a. surse;
- Au fost organizate seminare de informare privind criteriile de eligibilitate pentru APP II în cele 3 microregiuni din RDN;
- A fost oferită consultanță beneficiarilor din regiune în elaborarea proiectelor regionale înaintate în cadrul APP II;
- Au fost colectate NC ale aplicanților din RDN în cadrul APP II.

### 2.2.2 Oferirea consultanței și colectarea propunerilor de proiecte

Pentru desfășurarea APP II:

- În perioada 27 martie – 08 mai 2012, a fost oferită consultanță pentru 55 beneficiari;
- În perioada 03 – 05 aprilie 2012 au fost organizate 3 ședințe de consultare și informare în cele 3 microregiuni din RDN (mun. Bălți, or. Edineț și or. Soroca, în cadrul cărora au fost informate 185 de persoane;
- Până la 10.05.12, au fost depuse 55 NC, cu o valoare totală de 1 174 383,6 mii lei;
- NC au fost depuse conform priorităților și măsurilor din SDR Nord după cum urmează:
  - ✓ Prioritatea I – 28 proiecte
  - ✓ Prioritatea II – 12 proiecte
  - ✓ Prioritatea III – 15 proiecte

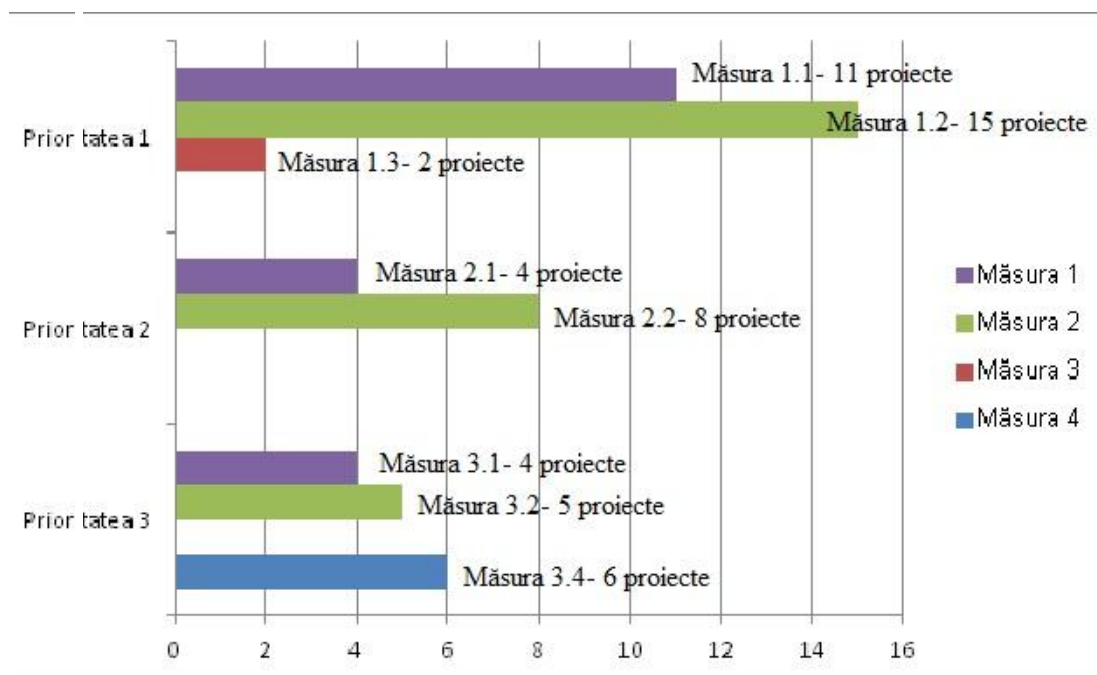

- 6 iunie 2012 – sesiunea de informare și consultare în contextul APP2;

- 25 iunie 2012 – seminarul instructiv-informativ cu genericul „Elaborarea și managementul proiectelor investiționale”.

### 2.2.3. Evaluarea proiectelor regionale depuse în cadrul APP II

La ședința din 11 mai 2012 au fost supuse evaluării și verificării administrative:

- 55 NC au fost supuse evaluării și verificării;
- 36 NC au fost aprobate și propuse către CRD Nord;
- 19 NC nu au întrunit condițiile de eligibilitate.

## 2.2. Gestionarea și implementarea proiectelor regionale inițiate în 2011, aprobate în 2012 și din surse externe

### 2.3.1 Implementarea proiectelor regionale inițiate în 2011;

#### ➤ **Implementarea proiectelor regionale din sursele FNDR**

În semestrul I, anul 2012, au fost implementate **11** proiecte de dezvoltare regională :

#### ➤ **Acceptate spre finanțare din FNDR în 2010 – 5 proiecte (suma totală: 70638,04 mii lei)**

#### **1. Proiectul nr. 9220: „Alimentarea orașului Fălești cu apă din râul Prut”, or. Fălești, (finalizat în 2011)**

*Denumirea aplicantului:* Consiliul Raional Fălești;

*Prioritatea 1:* Reabilitarea infrastructurii fizice;

*Măsura 1.1:* Reabilitarea și construcția rețelelor de apă, de canalizare și a stațiilor de epurare;

*Obiectivul general al proiectului:* Consolidarea cooperării regionale în scopul asigurării cu apă potabilă și canalizare a populației din raionul Fălești.

*Localizarea proiectului:* or. Fălești;

*Suma totală a proiectului:* **18 736,9 mii lei;**

*Suma alocată din FNDR în anul 2012:* 0 mii lei (11 336,9 mii lei au fost alocați în 2011);

*Suma valorificată din FNDR în anul 2012:* 0 mii lei (11 251,06 mii lei valorificat în 2011);

*Contribuție APL:* 2 000,0 mii lei;

*Contribuția altor finanțatori (Fondul Ecologic Național):* 5 400,0 mii lei;

*Durata de implementare a proiectului:* 18 luni.

*Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:* 13.01.12 – recepția la terminarea lucrărilor. La 29.06.12 – semnarea actului de predare-primire a lucrărilor.

*Rezultatele obținute la momentul raportării:* Stația de filtrare transmisă în gestiune beneficiarului.

#### **2. „Proiectul nr. 9293: „Conectarea Zonei Economice Libere „Bălți” la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces” mun. Bălți**

*Denumirea applicantului:* Primăria orașului Bălți;

*Prioritatea 1:* Reabilitarea infrastructurii fizice;

*Măsura 1.1:* Reabilitarea și construcția rețelelor de apă, canalizare și a stațiilor de epurare

*Măsura 1.2:* Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri existente.

*Măsura 1.3:* Dezvoltarea și diversificarea căilor de acces și a rețelelor de comunicații

*Obiectivul general al proiectului:* Asigurarea conectării infrastructurii Zonei Economice Libere „Bălți” la toate utilitățile: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces.

*Localizarea proiectului:* mun. Bălți.

*Suma totală a proiectului:* **12 998,0 mii lei;**

*Suma alocată din FNDR în anul 2012:* **8 278,9 mii lei;**

*Suma valorificată din FNDR în anul 2012:* **3 798,37 mii lei;**

*Contribuție APL:* 1 363,7 mii lei;

*Contribuția altor finanțatori:* 1 590,1 mii lei;

*Durata de implementare a proiectului:* 6 luni.

*Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:* Semnarea acordului adițional pentru lucrările adăugătoare în valoare de 700,37 mii lei; (nr. 1 din 5.01.12); efectuarea controlului din partea ISC – 05.04.12; 04.05.12 – vizită în teren cu scopul verificării lucrărilor adăugătoare, apărute în 2012, în valoare de 205,955 mii lei;

*Rezultatele obținute în momentul raportării:* Finalizarea reconstrucției a 1,3 km de drum.

Conform ordinului MDRC nr.58 din 26.06.2012, recepția finală a lucrărilor în cadrul proiectului este preconizată pentru data de 12.07.2012.

### **3. „Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități)”, or. Biruința**

*Denumirea applicantului:* Primăria orașului Biruința, raionul Sîngerei;

*Prioritatea 3:* Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice;

*Măsura 3.2:* Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea și crearea poligoanelor moderne de stocare a deșeurilor nereciclabile;

*Obiectivul general al proiectului:* Crearea, la nivel regional, a sistemului integrat de management al deșeurilor solide pentru 7 localități.

*Localizarea proiectului:* RDN, Primăria or. Biruința, Alexăndreni (s. Alexăndreni, s. Heciul Vechi, s. Grigorești, s. Tîplești, s. Tîpletești), s. Heciul Nou raionul Sîngerei.

*Suma totală a proiectului:* **4 099,5 mii lei;**

*Suma alocată din FNDR în anul 2012:* **268,6 mii lei;**

*Suma valorificată din FNDR în anul 2012:* **1,98 mii lei;**

*Contribuție APL:* 709,6 mii lei;

*Contribuția altor finanțatori (Fondul Ecologic Național):* 1200 mii lei;

*Durata de implementare a proiectului:* 11 luni.

*Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:* 25.02.12 – recepția finală a lucrărilor de construcție a depozitului; 05.03.12 – semnarea actului de predare-primire a depozitului de acumulare a DMS; 16.03.12 – recepția la terminarea lucrărilor a 20 de platforme; elaborarea caietului de sarcini și organizarea achizițiilor pentru construcția celor 31 de platforme de colectare a DMS rămase; semnarea contractului de antrepriză.

*Rezultatele obținute la momentul raportării:* 34 platforme de colectare a deșeurilor realizate din 51 – planificate.

Conform ordinului MDRC nr.58 din 26.06.2012, recepția finală a lucrărilor în cadrul proiectului este preconizată pentru data de 11.07.2012

#### **4. Proiectul nr. 9222: Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea de Nord**

*Denumirea applicantului:* Primăria orașului Otaci;

*Prioritatea I:* Reabilitarea infrastructurii fizice;

*Măsura I.1:* Reabilitarea și construcția rețelelor de apă, canalizare și a stațiilor de epurare;

*Obiectivul general al proiectului:* Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare a or. Otaci;

*Localizarea proiectului:* Regiunea de Dezvoltare Nord, or. Otaci, raionul Ocnița;

*Suma totală a proiectului:* **21 319,5 mii lei;**

*Suma alocată din FNDR în anul 2012:* **4 512,2 mii lei;**

*Suma valorificată din FNDR în anul 2012:* **1,18 mii lei;**

*Durata de implementare a proiectului:* 24 luni.

*Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:* Elaborarea PT pentru sistema de canalizare și a stației de epurare; 25.02.12 – recepția finală a lucrărilor de construcție a depozitului; 20.06.12 – obținerea raportului de verificare și expertizare a PT.

*Rezultatele obținute la momentul raportării:* Finalizarea construcției apeductului și a rezervoarelor de acumulare a apei potabile.

Conform ordinului MDRC nr. 58 din 26.06.2012, recepția finală a lucrărilor în cadrul proiectului a fost preconizată în data de 11.07.2012, iar, conform procesului-verbal din 03.07.2012, recepția finală a fost transferată pentru data de 20.07.2012

#### **5. Proiectul nr. 9666: „Renovarea drumului regional internațional M-14 prin or. Edineț”, or. Edineț**

*Denumirea applicantului:* Primăria or. Edineț;

*Prioritatea I:* Reabilitarea infrastructurii fizice;

*Măsura 1.2:* Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri existente și a conexiunilor internaționale;

*Obiectivul general al proiectului:* Crearea condițiilor optime pentru deplasarea cetățenilor pe strada centrală a or. Edineț, parte a traseului internațional Chișinău – Cernăuți.

*Localizarea proiectului:* Regiunea de Dezvoltare Nord, or. Edineț, r-nul Edineț

*Suma totală a proiectului:* **20 845,7 mii lei;**

*Suma alocată din FNDR în anul 2012:* **5 453,1 mii lei;**

*Suma valorificată din FNDR în anul 2012:* **1, 57 mii lei;**

*Durata de implementare a proiectului:* 11 luni.

*Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:* 05.01.12 – semnarea acordului adițional pentru lucrările adăugătoare în valoare de 651,408 mii lei (nr. 1 la Contractul de antrepriză nr. 31 din 05.09.11); 4-5 iunie a fost evaluat impactul proiectului de către o echipă de experți de la ESRA.

*Rezultatele obținute la momentul raportării:* finalizarea construcției drumului cu o lungime de 4,3 km.

Conform ordinului MDRC nr. 58 din 26.06.2012, recepția finală a lucrărilor în cadrul proiectului este preconizată în data de 12.07.2012

➤ **Acceptate spre finanțare din FNDR în 2011 – 2 proiecte**

**(suma totală: 32 635,2 mii lei)**

**6. Proiectul nr. 9661: „Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord”**

*Denumirea applicantului:* Primăria orașului Soroca;

*Prioritatea 3:* Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice;

*Măsura 3.2.:* Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea și crearea poligoanelor moderne de stocare a deșeurilor nereciclabile;

*Obiectivul general al proiectului:* Îmbunătățirea nivelului de protecție a mediului și reducerii riscurilor asupra sănătății populației din zona țintă prin consolidarea managementului integrat al deșeurilor menajere solide.

*Localizarea proiectului:* Regiunea de Dezvoltarea Nord: r-nul Soroca;

*Suma totală a proiectului:* **30 302,6 mii lei;**

*Suma alocată din FNDR în anul 2012:* **326,4 mii lei;**

*Suma valorificată din FNDR în anul 2012:* **0 mii lei;**

*Durata de implementare a proiectului:* 24 luni.

*Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:* contractarea serviciilor de proiectare pentru stația de sortare și a platformelor; organizarea a 2 ședințe de lucru cu instituțiile de proiectare; 13.06.12 – depunerea PT la serviciul de verificare și expertizare.

*Rezultatele obținute la momentul raportării:* Elaborat PT pentru stația de sortare, platformele pentru amplasarea containerelor, poligonului pentru deșeuri, drumului de acces și a platformei pentru dejecții animaliere – la etapa de verificare și expertizare.

**7. Proiectul nr. 9665: „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune”, com. Larga**

*Denumirea applicantului:* Comuna Larga, raionul Briceni;

*Prioritatea 2:* Susținerea dezvoltării sectorului privat, în special, în regiunile rurale;

*Măsura 2.2:* Consolidarea capacităților instituțiilor de informare, de consultanță și de susținere;

*Obiectivul general al proiectului:* Consolidarea unui sector economic privat regional dinamic, capabil să facă față forțelor concurențiale și competiției regionale, naționale și internaționale la nivelul r-ului Briceni.

*Localizarea proiectului:* Comuna Larga, raionul Briceni;

*Suma totală a proiectului:* **3 150,8 mii lei;**

*Suma alocată din FNDR în anul 2012:* **3 150,8 mii lei;**

*Suma valorificată din FNDR în anul 2012:* **0 mii lei;**

*Contribuție APL:* 2 276,14 mii lei;

*Durata de implementare a proiectului:* 12 luni.

*Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:* Contractarea expertului pentru elaborarea caietului de sarcini privind proiectarea lucrărilor de reparație a clădirii Incubatorului de afaceri; contractat serviciile de proiectare pentru lucrările de reparații și montaj; finalizarea documentației tehnice pentru lucrări; 25.06.12 – deschiderea ofertelor pentru achiziționarea tehnicii de calcul în cadrul proiectului.

*Rezultatele obținute la momentul raportării:* PT pentru lucrările de reparații elaborat.

- **Aprobate spre finanțare în anul 2012 – 4 proiecte noi**, conform deciziei CNCDR nr. 5/12 din 23.02.12 în sumă de **34 744,6 mii lei**.

**8. Proiectul nr. 9892: „Reparația sectorului de drum local L-37 „Lipcani-Bălășinești-Corjeuți-Tîrnova”, s. Corjeuți, r-nul Briceni**

*Denumirea applicantului:* Primăria s. Corjeuți, raionul Briceni;

*Prioritatea 1:* Reabilitarea infrastructurii fizice;

*Măsura 1.2:* Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri existente și a conexiunilor internaționale;

*Obiectivul general al proiectului:* Dezvoltarea economică a localităților Corjeuți, Balasinești, r-nul Briceni, și Trinca, r-nul Edineț, ca una din zonele defavorizate.

*Localizarea proiectului:* satul Corjeuți, r-nul Briceni; satul Trinca, r-nul Edineț,

*Suma totală a proiectului:* **39 611,8 mii lei;**

*Suma alocată din FNDR în anul 2012: 13 489,2 mii lei;*

*Suma valorificată din FNDR în anul 2012: 0 mii lei;*

*Durata de implementare a proiectului: 18 luni.*

*Activitățile desfășurate în cadrul proiectului: Documentația tehnică pentru construcția drumului supusă la Serviciul de verificare și expertizare a proiectelor la începutul lunii iunie; 11.07.12 – depunerea caietului de sarcini pentru achiziționarea lucrărilor la AAP.*

*Rezultatele obținute la momentul raportării: Caiet de sarcini elaborat și depus la AAP.*

### **9. Proiectul nr. 9889: „Intersecții Culturale” s. Băhrinești, r-nul Florești**

*Denumirea applicantului: Primăria Băhrinești, r-nul Florești;*

*Prioritatea 3: Îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice;*

*Măsura 3.4: Reabilitarea edificiilor turistice și integrarea lor în circuitele turistice internaționale;*

*Obiectivul general al proiectului: Integrarea localităților Rediul-Mare, r-nul Dondușeni; Pelinia, r-nul Drochia; Alexăndreni, r-nul Sângerei; Rogojeni, r-nul Șoldănești; Negureni, r-nul Telenești, și a 12 localități din r-nul Florești, situate în lunca râului Răut, în circuitul cultural-turistic regional;*

*Localizarea proiectului: Regiunea Nord, inclusiv r-nul Dondușeni (satul Rediul-Mare), r-nul Drochia (satul Pelinia), r-nul Sângerei (Alexăndreni), r-nul Florești (satul Ștefănești, comuna Prajila, satul Prodănești, comuna Gura Căinarului, comuna Ghindești, r-nul Florești, satul Mărculești, orașul Mărculești, r-nul Florești, satul Vărvăreuca, orașul Florești) r-nul Șoldănești (satul Rogojeni), r-nul Telenești (satul Negureni);*

*Suma totală a proiectului: 1 255,4 mii lei;*

*Suma alocată din FNDR în anul 2012: 1 255,4 mii lei;*

*Suma valorificată din FNDR în anul 2012: 0 mii lei;*

*Contribuția altor finanțatori (FISM): 1 293,2 mii lei;*

*Durata de implementare a proiectului: 18 luni.*

*Activitățile desfășurate în cadrul proiectului: 13.06.12 – Documentația tehnică pentru lucrările de amenajare a Centrului de Cultură a fost depusă la Serviciul de Verificare și Expertizare; a fost depus caietul de sarcini pe lucrări la AAP.*

*Rezultatele obținute la momentul raportării: Caiet de sarcini elaborat și depus la AAP.*

### **10. Proiectul nr. 9893: „Reabilitarea rețelei de drum public local Pîrlița-Dumbrăveni-Vădeni-Florești”, CR Soroca**

*Denumirea applicantului: Consiliul raional Soroca;*

*Prioritatea 1: Reabilitarea infrastructurii fizice;*

*Măsura 1.2: Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri existente și a conexiunilor internaționale;*



*Obiectivul general al proiectului:* Îmbunătățirea accesului populației, bunurilor și serviciilor din r-urile Soroca și Florești pe piața regională, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile, prin asigurarea unei infrastructuri de transport de calitate, care va face conexiunea cu rețeaua de drumuri naționale.

*Localizarea proiectului:* Regiunea Nord, r-urile Soroca și Florești, 3 comune – Pîrlița-Dumbrăveni-Vădeni – din r-nul Soroca, 5 localități rurale din r-nul Florești situate la hotar cu r-nul Soroca – Răduleni Noi, Dumitreni, Chirilovca, Alexeevca, Gvozdova – cu conexiune la drumul republican R-7 și Magistrala 2, care asigură legătura cu orașul Soroca și Regiunea Vinița, Ucraina;

*Suma totală a proiectului:* **36 171,2 mii lei;**

*Suma alocată din FNDR în anul 2012:* **8 440,9 mii lei;**

*Suma valorificată din FNDR în anul 2012:* **0 mii lei;**

*Contribuția altor finanțatori (Fondul rutier):* 12 000,0 mii lei;

*Durata de implementare a proiectului:* 24 luni.

*Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:* Elaborarea caietului de sarcini pentru porțiunea de drum ce urmează a fi finanțată din sursele FNDR. S-a depus pachetul de documente la AAP; 02.04.2012 – deschiderea ofertelor și semnarea contractului de antrepriză cu SRL „Nou Const”; elaborarea acordului de parteneriat; 12.06.12 – lansarea proiectului; 18.06.12 – începerea lucrărilor de construcții.

*Rezultatele obținute la momentul raportării:* Lucrări de construcție a drumului, demarate.

### **11. Proiectul nr. 9898 „Finalizarea construcției apeductului magistral Bălți-Sîngerei cu ramificații comunitare”, CR Sîngerei**

*Denumirea applicantului:* Consiliul raional Sîngerei;

*Prioritatea I:* Reabilitarea infrastructurii fizice;

*Măsura I.1:* Reabilitarea și construcția rețelelor de apă, de canalizare și a stațiilor de epurare;

*Obiectivul general al proiectului:* Acces la surse de apă potabilă sigure și de calitate a populației din r-nul Sîngerei, oportunitate creată pentru r-nul Telenești.

*Localizarea proiectului:* Regiunea Nord, r-nul Sîngerei: or. Biruinta, s. Alexăndreni s. Heciul Vechi, s. Tiplești, s. Țîplețești, s. Grigorești, s. Heciul Nou, Trifănești, Sîngerei Noi, Marinești, Mîndreștii Noi, Biliceni Noi, Biliceni Vechi, or. Sîngerei, s. Vrănești, s. Rădoaia, s. Izvoare, s. Valea Norocului, s. Drăgănești, s. Sacarovca, s. Chirileni, s. Cotiujenii Mici, s. Alexeuca, s. Gura Oituz, s. Lipovanca, s. Brejeni, s. Ciuciueni, s. Iezarenii Vechi, s. Grigorăuca, s. Cozeșt cu prelungire pe teritoriul r-nului Telenești.;

*Suma totală a proiectului:* **24 473,2 mii lei;**

*Suma alocată din FNDR în anul 2012:* **10 000,0 mii lei;**

*Suma valorificată din FNDR în anul 2012:* **0 mii lei;**

*Durata de implementare a proiectului:* 24 luni.

*Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:* 18.05.12, către ADR Nord a fost prezentat raportul de verificare și expertizare cu nr. 0198-04-12 a PT; elaborarea caietului de sarcini.

*Rezultatele obținute la momentul raportării:* Caiet de sarcini elaborat pentru construcția apeductului și depus pachetul de documente la AAP.

Ca rezultat, în 2012 ADR Nord va implementa **10** proiecte de dezvoltare regională (suma totală: **55 598,1 mii lei**) finanțate din sursele FNDR. Proiectul nr. 1 a fost finalizat în 2011. În data de 13.01.2012 a fost organizată recepția la terminarea lucrărilor.

### ➤ **Implementarea proiectelor cu surse externe de finanțare**

**Proiectele finanțate din sursele Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), implementate de ADR Nord:**

#### ➤ *Programul: Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova*

#### **1. Proiectul „Aprovizionarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costești, r-nul Rîșcani”**

*Denumirea applicantului:* Primăria Costești, r-nul Rîșcani;

*Prioritatea I:* Reabilitarea infrastructurii fizice;

*Măsura 1.1:* Reabilitarea și construcția rețelelor de apă, canalizare și a stațiilor de epurare;

*Obiectivul general al proiectului:* Crearea accesului la servicii de apă și canalizare accesibile pentru locuitorii satului Duruitoarea Veche;

*Localizarea proiectului:* Regiunea Nord, r-nul Rîșcani;

*Suma totală a proiectului:* 2 286,5 mii lei;

*Suma alocată de la GIZ în anul 2012:* 1 046,40 mii lei;

*Suma valorificată în anul 2012:* 956,38 mii lei;

*Contribuția APLI și II:* 120,0 mii lei;

*Durata de implementare a proiectului:* 12 luni.

*Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:* Lucrări de construcție a apeductului și a rețelelor de canalizare; dezvoltarea capacităților ÎM Costești;

*Rezultatele obținute la momentul raportării:* Finalizarea lucrărilor de construcții; 7,1 km de rețele de apeduct integral și o porțiune de 3,2 km rețele de canalizare; sînt în curs lucrările de conectare a stațiilor de pompare nr. 1 și nr. 2 la rețelele electrice.

#### **2. Proiectul „Iluminare stradală în comuna Tătărauca Veche, r-nul Soroca”**

*Denumirea applicantului:* Primăria comunei Tătărauca Veche, r-nul Soroca;

*Prioritatea 1:* Reabilitarea infrastructurii fizice;

*Măsura 1.2:* Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri existente și a conexiunilor internaționale.

*Obiectivul general al proiectului:* Crearea sistemului de iluminare stradală în cele 6 localități ale comunei Tătărauca Veche.

*Localizarea proiectului:* Regiunea Nord, r-nul Soroca;

*Suma totală a proiectului:* 800,0 mii lei;

*Suma transferată de la GIZ în anul 2012:* 390,36 mii lei;

*Suma valorificată în anul 2012:* 0 mii lei;

*Durata de implementare a proiectului:* 12 luni.

*Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:* Finalizarea PT; 26.04.2012 – lansarea oficială a proiectului; crearea ÎM; informarea; activități de informare și conștientizare.

*Rezultatele obținute la momentul raportării:* 02.07.12 – prezentarea către ADR Nord a raportului de verificare și expertizare la PT; este în curs de elaborare caietul de sarcini.

### **1. Proiect finanțat din sursele Ambasadei Republicii Cehe: „Analiza cost-beneficiu – instrument necesar pentru implementarea proiectelor investiționale de anvergură”**

*Denumirea aplicantului:* Agenția de Dezvoltare Regională Nord;

*Obiectivul general al proiectului:* Informarea autorităților publice și actorilor regionali privind importanța analizei cost-beneficiu în perspectiva accesării fondurilor europene și implementării proiectelor investiționale de anvergură.

*Localizarea proiectului:* Regiunea Nord;

*Suma totală a proiectului:* **5 943 de euro (91 074 MDL);**

*Suma transferată de la Ambasada R. Cehe către ADR Nord în anul 2012:* **91 336 lei;**

*Suma valorificată în anul 2012:* **21 995 mii lei;**

*Durata de implementare a proiectului:* 3 luni.

*Activitățile desfășurate în cadrul proiectului:* mai-iunie 2012 – elaborarea planului de implementare a proiectului; 22.06.12 – 07.07.12 elaborarea conceptului și textului broșurii;

*Rezultatele obținute la momentul raportării:* 06.03.12 – semnarea contractului de finanțare; 19.06.12 – semnarea contractelor pentru achiziționarea serviciilor (contractele nr. 85 și nr. 86 din 19 iunie 2012).

#### **➤ Evidența și monitorizarea responsabilităților contractuale**

Pe parcursul semestrului I, ADR Nord a monitorizat implementarea proiectelor, prin intermediul următoarelor instrumente:

- Actualizarea planurilor de implementare a proiectelor și verificarea permanentă a îndeplinirii termenelor de executare a lucrărilor;
- Ședințe săptămânale cu managerii de proiecte și recepționarea rapoartelor săptămânale de la managerii de proiecte;

- Verificarea actelor de recepție a lucrărilor prezentate de operatorii economici;
- Efectuarea vizitelor la locul de implementare a proiectelor;
- Planificarea și efectuarea vizitelor speciale la proiectele la care au fost semnalate nereguli.

➤ ***Elaborarea rapoartelor trimestriale de monitorizare a proiectelor***

În cadrul procesului de implementare a fiecărui proiect au fost elaborate rapoarte după cum urmează:

- În rezultatul fiecărei vizite la locul implementării proiectului, managerul de proiect sau o altă persoană responsabilă pentru implementarea proiectului din cadrul ADR a elaborat un *Raport privind monitorizarea realizării activităților conform planului de implementare a proiectului*, și un proces-verbal al ședinței de lucru;
- *Raport privind valorificarea bugetului proiectului individual*, care a fost elaborat lunar de către specialistul în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor. Acest raportul reflectă mijloacele financiare aprobate, contractate și transferate, precum și cheltuielile efectuate în cadrul proiectului individual, redistribuite conform structurii bugetare și surselor de finanțare.
- *Raportul privind monitorizarea proiectului individual*, care a fost elaborat trimestrial de către specialistul în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor.
- *Raportul trimestrial privind monitorizarea mijloacelor financiare*, care a fost elaborat de către specialiștii Secției management proiecte și prezentat către MDRC și CRD.

➤ ***Elaborarea documentelor de transmitere a proprietății și de gestiune a serviciilor publice noi create***

În conformitate cu legislația în vigoare, ADR Nord va elabora documente de transmitere a bunurilor / serviciilor publice noi create în cadrul proiectelor finanțate din sursele FNDR, inclusiv cele cu suportul donatorilor străini, utilizând procedurile de transmitere în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizațiilor, instituțiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcțiilor și altor mijloace fixe, aprobate prin HG nr. 688 din 09.10.1995.

GIZ va oferi experți care vor facilita procesul de elaborare a documentelor de transmitere a proprietății și de gestiune a serviciilor publice noi create.

➤ ***Evaluarea impactului proiectului implementat***

La 6 luni după încheierea fiecărui proiect se va efectua un studiu de impact. Studiul va fi realizat în parteneriat cu Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți. În total, vor fi efectuate 4 studii de impact. De asemenea, se vor efectua sondaje pe site-ul ADR Nord.

2.3.3 *Dezvoltarea capacităților întreprinderilor prestatoare de servicii publice create sau dezvoltate în cadrul proiectelor implementate în 2012.*

Asistență privind dezvoltarea capacităților întreprinderilor prestatoare de servicii publice create sau dezvoltate în cadrul proiectelor a fost oferită ÎM ce activează în domeniul asigurare cu apă și canalizare, din cadrul proiectelor din or. Fălești; or. Otaci, r-nul Ocnița; or. Biruința, r-nul Sîngerei; or. Soroca și or. Costești, r-nul Rîșcani.

➤ ***Instruirea angajaților întreprinderilor prestatoare de servicii publice***

În cadrul proiectului „Asigurarea cu apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costești, r-nul Rîșcani”, ADR Nord, în colaborare cu experții GOPA din cadrul GIZ, au oferit directorilor ÎM consultanță și suport privind documentația necesară pentru un management adecvat al întreprinderii.

În cadrul proiectului din com. Tătărauca Veche a avut loc atelierul de lucru cu tematica: „Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărauca Veche”, unde s-a convenit să se petreacă un sondaj în toate cele 6 localități ale comunei Tătărauca Veche, cu implicarea primăriei, directorului ÎM, consilierilor locali și reprezentanților societății civile pentru a aprecia capacitatea de plată a locuitorilor pentru energia electrică, care va fi consumată de sistemul de iluminat stradal și aprecierea locurilor de instalare a instalațiilor de iluminat (în afară de locurile unde sînt situate clădirile publice).

➤ ***Îmbunătățirea documentelor de reglementare internă a întreprinderilor prestatoare de servicii publice***

În luna aprilie au avut loc 2 *ședințe de lucru* privind „Elaborarea planului de afaceri al ÎM Apă-Canal Costești”.

A fost organizată o sesiune de consultanță pentru îmbunătățirea regulamentului intern al întreprinderilor, în cadrul căreia directorii ÎM „Apa-Canal Costești” și „Apă-Canal Rîșcani” au primit setul de documente necesar pentru activitatea întreprinderii, inclusiv contractul de furnizare a apei potabile și de recepționare a apelor uzate.

➤ ***Desfășurarea campaniilor de informare a consumatorilor***

În cadrul proiectelor „Iluminare stradală eficientă în com. Tătărauca Veche”, r-nul Soroca și „Reabilitarea rețelei de drum public local (L-186) Pîrlița-Dumbrăveni-Vădeni-Florești, în lungime de 13,3 km” or. Soroca au fost organizate activități de lansare, în cadrul cărora au fost informate 77 de persoane. Au fost elaborate 4 panouri informative (pentru fiecare localitate câte 2) și 100 de pliante a câte 50 pentru fiecare proiect.

În luna mai, în com. Tătărauca Veche, r-nul Soroca a avut loc atelierul de lucru „Informarea elevilor de la Gimnaziul „Eva Gudumac”, în cadrul căruia au fost informați 43 de elevi.

➤ ***Instruirea APL I și II (primari și consilieri) despre rolul APL în gestiunea eficientă a serviciilor publice.***

Au fost organizate 2 ateliere de lucru privind gestiunea eficientă a serviciilor publice: standardele de calitate a serviciilor, rolul și responsabilitățile APL I și II în procesul de implementare a proiectelor investiționale finanțate din sursele FNDR, în cadrul cărora au participat 68 de reprezentanți din primării și consilierii locali din comunele și raioanele unde se implementează proiecte. Organizarea atelierelor de lucru s-a efectuat în parteneriat cu GIZ.

### **III. Dezvoltarea capacităților actorilor regionali**

#### **3.1 Dezvoltarea instituțională a ADR Nord**

Un alt obiectiv al ADR Nord, stabilit pentru 2012, este dezvoltarea capacităților actorilor regionali în elaborarea atât a strategiilor / planurilor și proiectelor instituționale, cât și regionale prin suportul consultanților din partea partenerilor de dezvoltare.

Reieșind din faptul că dezvoltarea profesională este un proces continuu, echipa ADR Nord a pretins permanent perfecționarea capacităților prin participarea activă la diverse seminare, traininguri, vizite de studiu peste hotare, instruirii organizate de colaboratorii MDRC, GIZ și partenerii de dezvoltare (tabelul de instruirii se anexează) axate nemijlocit pe domeniile de activități ale Agenției, precum și pe domenii aferente.

Totodată, colaboratorii ADR Nord au organizat sesiuni de instruire pentru potențialii aplicanți în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte, etapa I și II, pentru membrii CRD Nord, la care au participat activ și colaboratorii Agenției, cu prezentări în domeniul DR.

#### **3.2 Informarea și instruirea membrilor CRD Nord**

Pentru ca membrii CRD Nord să conștientizeze rolul activității lor în dezvoltarea regională, au fost petrecute diferite activități cu implicarea directă a acestora. Astfel, pe parcursul semestrului I, membrii CRD Nord au participat la 2 seminare informativ-instructive:

- „*Politicile naționale de dezvoltare și rolul CRD în dezvoltarea regională*”, organizat în data de 22 februarie 2012
- „*Elaborarea și managementul proiectelor investiționale*”, organizat în data de 25 iunie 2012, la care au participat și managerii de proiecte, formatorii acestor activități fiind specialiștii ADR Nord și specialiștii în domeniile vizate.

#### **3.3 Facilitarea schimbului de experiență pentru membrii ADR Nord și CRD Nord**

Preluarea experienței pozitive din domeniul dezvoltării regionale atât din interiorul țării, cât și de peste hotare reprezintă un obiectiv important în dezvoltarea capacităților membrilor

CRD Nord și ADR Nord privitor la identificarea ideilor de proiecte, elaborarea și promovarea politicilor regionale și implementarea strategiei regionale. În acest sens, sînt binevenite vizitele de studiu în regiunile din țară, unde există exemple de proiecte de succes implementate, în scopul preluării experienței țărilor europene, care au obținut succese în procesul de dezvoltare regională.

În acest sens, în lunile mai și iunie s-au desfășurat o serie de activități de organizare a vizitei de studiu în R. Letonia cu participarea specialiștilor ADR Nord și pentru membrii CRD Nord, vizita de studiu în R. Letonia se va desfășura în perioada 09-13 iulie 2012.

## **IV. Comunicarea, promovarea și transparența**

### **4.1 Promovarea potențialului RDN**

În semestrul I din 2012, ADR Nord a continuat să promoveze potențialul socio-economic și cultural al RDN prin diferite mijloace: în cadrul activităților organizate de ADR Nord și prin intermediul site-urilor [www.adrnord.md](http://www.adrnord.md), [www.comunicate.md](http://www.comunicate.md), [www.civic.md](http://www.civic.md) etc. Cu ajutorul platformele de socializare (Facebook, Twitter, Odnoklassniki, Parteneri.md etc.) ADR Nord a partaja link-uri către articole informative relevante și fotografii, organizate în albume tematice. În total, ADR Nord a administrat peste 10 canale de comunicare online.

De asemenea, cu ocazia evenimentelor de promovare a RDN (a se vedea evenimentele enumerate mai jos) au fost elaborate și difuzate diverse materiale promoționale (postere, pliante etc.).

ADR Nord a continuat procesul de identificare și creare a parteneriatelor cu instituții și organizații cu misiune similară, precum și cu cele ce activează în alte domenii, în scopul utilizării experienței externe pentru dezvoltarea RDN.

Asigurarea accesului sporit la informații din domeniul DR și din domeniile adiționale, atât pentru colaboratorii ADR Nord, cât și pentru actorii regionali, a fost prioritatea de bază în domeniul comunicării, informării și promovării RDN. În acest sens, ADR Nord s-a continuat să se informeze din buletinele electronice elaborate de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”; Asociația pentru Dezvoltare Participativă ADEPT; Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”; Centrul NAION CONTACT; Asociația pentru Politică Externă (APE); ONG „Promo-Lex”; UNFPA Moldova; Buletinul Civic.md; Buletinul CONTACT etc.

De asemenea, ADR Nord a monitorizat periodic mass-media regională și națională în vederea selectării materialelor informative ce reflectă activitățile specifice Agenției, dar și ale altor instituții ce activează în domeniul DR.

*În perioada ianuarie-iunie 2012, ADR Nord a organizat următoarele activități de promovare a potențialului RDN:*

## - Forumul Economic Interregional Moldo-Român

Bălți, 28-29 martie 2012. Forumul Economic Interregional Moldo-Român „Promovarea potențialului economic și crearea oportunităților de atragere a investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord”, organizat de ADR Nord din Republica Moldova și ADR Vest din România, sub patronajul



Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a reunit **peste 200 de participanți**, printre care oameni de afaceri din Regiunea Vest a României și din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, reprezentanți ai ministerelor din Republica Moldova, membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare din Republica Moldova, ambasadori, reprezentanți ai Consulatului General al României din Bălți, reprezentanți ai ONG-urilor din Republica Moldova, parteneri ai ADR Nord etc. În cadrul acestui eveniment au fost organizate 3 sesiuni plenare, 6 panele tematice conform sectoarelor economice din RDN și o conferință de presă.

- În rezultatul evenimentului, ADR Nord a elaborat un raport de presă ce conține peste 70 de referințe în presa locală, națională și internațională. Raportul de presă se găsește aici: <http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=402&id=1383>.

## - Ziua Europei, sărbătorită la Bălți

Bălți, 26 mai 2012. ADR Nord, în colaborare cu Centrul „Pro-Europa” Bălți, Consulatul General al României la Bălți și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a organizat, în contextul Zilei Europei, o dezbatere cu genericul „Imaginea Republicii Moldova în presa moldovenească și în cea europeană”.



Cu sprijin din partea Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Bălți, Ziua Europei a continuat în scuarul din Piața Vasile Alecsandri cu un festival de muzică și dans, la care au participat formații artistice din nordul Moldovei. La festival au participat autoritățile locale din Bălți și președintele CRD Nord, **Ion Parea**. // <http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1330>

## - ADR Nord la Forumul Național de Dezvoltare Rurală din Brăviceni

Brăviceni, Orhei, 15-16 mai 2012. În cadrul evenimentului, care a întrunit **peste 150 de participanți**, au fost prezentate expoziții și prezentări despre cele mai bune practici, proiecte de succes, posibilități existente și posibilități noi de dezvoltare rurală. //

<http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1318>





## ***Masă rotundă: „Disparitățile regionale în Republica Moldova - oportunități de îmbunătățire a cadrului legal și strategic”***

Bălți, 7 iunie 2012. Agenția de Dezvoltare Regională Nord a organizat, în parteneriat cu IDIS „Viitorul”, masa rotundă cu genericul „Disparitățile regionale în Republica Moldova – oportunități de îmbunătățire a cadrului legal și strategic”.



La discuții au participat actori regionali din diverse structuri: autorități publice locale, mediu academic, antreprenori, societate civilă, mass-media. //

<http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1360>

### ***- ADR Nord la Aeroportul Internațional Mărculești***

Mărculești, 14 iunie 2012. Directorul ADR Nord, Ion Bodrug, a efectuat o vizită de documentare și informare la Aeroportul Internațional Mărculești, unde s-a întâlnit cu directorul general al aeroportului, Sergiu Ciobanu.



Cei doi directori au făcut schimb de informații generale despre instituțiile pe care le reprezintă și au discutat despre posibilitățile de dezvoltare a Aeroportului Internațional Mărculești, instituție de importanță majoră atât pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, cât și pentru Republica Moldova. //

<http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1380>

***- Ziua Dunării.*** La 29 iunie 2012, în cadrul ADR Nord s-a organizat o masă rotundă cu participarea actorilor regionali unde s-a discutat despre unul dintre cele mai importante fluviu din Europa – Dunărea, Euroregiunea și despre Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării prioritățile și oportunitățile Republicii Moldova pentru atragerea fondurilor investiționale.

<http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1406>

## **4.2 Promovarea proiectelor implementate, conform priorităților SDRN**

În semestrul I din 2012, ADR Nord a mediatizat activitățile de lansare a proiectelor prin intermediul canalelor proprii de comunicare, a mass-mediei, a panourilor informative și a pliantelor de prezentare a proiectelor, a difuzat comunicate de presă, publicate pe site-urile [www.adrnord.md](http://www.adrnord.md) și [www.comunicate.md](http://www.comunicate.md), site-uri care au servit drept primă sursă pentru materialele informative publicate în presa regională și cea națională.

Informații relevante despre proiectele regionale implementate au fost diseminate prin intermediul panourilor informaționale, care au au fost montate în localitățile beneficiarilor proiectelor de DR.

Informarea reprezentanților mass-media privind etapele implementării proiectelor s-a efectuat prin intermediul vizitelor în teritoriu și a comunicatelor de presă.

ADR Nord a actualizat rubrica „Proiecte de dezvoltare regională” din site-ul [www.adrnord.md](http://www.adrnord.md) (meniul orizontal), asigurând astfel transparența etapelor de implementare a proiectelor.

În perioada de raportare, ADR Nord a lansat 3 proiecte de DR. Lansarea acestora a fost promovată în toate canalele de comunicare ale ADR Nord, precum și în mass-media.

### ***Proiecte lansate***

*Tătărauca Veche, Soroca, 26 aprilie 2012.* MDRC, ADR Nord și Primăria comunei Tătărauca Veche, raionul Soroca, au organizat evenimentul de lansare a proiectului de dezvoltare regională „*Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărauca Veche*”.



Lansarea proiectului a avut loc în incinta Gimnaziului „Eva Gudumac”. Până la finele anului 2012, în comuna Tătărauca Veche din raionul Soroca va fi instalat un sistem modern de iluminare stradală, de care vor beneficia în jur de 2200 de locuitori. // <http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1296>

*Bălți, 5 mai, 2012.* Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți și Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) au lansat, la inițiativa cercetătorilor de la universitatea bălțeană, proiectul „*Managementul competitivității strategice a capitalului uman pe piața muncii a Republicii Moldova în condițiile dezvoltării regionale*”, parte a programului de stat



„Dezvoltarea competitivității și creșterea economică durabilă în contextul economiei bazate pe cunoaștere, globalizare și integrare regională și europeană”, coordonat de către rectorul Academiei de Studii Economice a Moldovei, Grigore Belostecinic. Proiectul este finanțat de Academia de științe a Moldovei și va fi implementat, timp de 2 ani, de Universitatea de Stat „Alec Russo” în colaborare cu ADR Nord. // <http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1305>

Soroca, 12 iunie 2012. Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) și Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), în colaborare cu Consiliul raional Soroca, au lansat proiectul de dezvoltare regională „Reabilitarea rețelei de drum public local (L-186) Pîrlița-Dumbrăveni-Vădeni-Florești, în lungime de 13,3 km”. În 2012, ADR Nord și-



a planificat reabilitarea a 1,7 km din totalul de 13,3 km din lungimea drumului public local L-186. // <http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1364>

#### **4.3 Îmbunătățirea comunicării cu APL, partenerii interni și externi, ADR**

Planul de informare și comunicare al ADR Nord, elaborat în anii 2010 și 2011, a fost actualizat. Acest plan va asigura transparența și buna promovare a activităților ADR Nord. Măsurile de implementare a ghidului de comunicare în DR au avut ca scop:

- Promovarea obiectivelor de DR, RDN și activităților ADR Nord;
- Asigurarea transparenței privind valorificarea FNDR;

##### ***Asigurarea comunicării externe***

Pentru a asigura comunicarea eficientă a ADR Nord cu APL, ONG, publicul din RDN, mass-media regională și națională, potențialii donatori sau investitori și mediul de afaceri au fost utilizate următoarele instrumente: materiale informative (postere, pliante, broșuri), buletine informative, rapoarte semestriale/anuale, vizite de studiu, întruniri informative, mese rotunde, conferințe, comunicate și note de presă, avize, alte materiale informative.

***Comunicarea eficientă cu mass-media*** s-a desfășurat prin intermediul comunicatelor de presă, buletinelor informative, rapoartelor și dosarelor de presă, întrunirilor neformale, vizitelor informative, actualizării site-ului și a canalelor de comunicare în rețelele de socializare, prin organizarea conferințelor de presă și a zilei ușilor deschise.

***Comunicarea cu APL, potențialii donatori sau investitori și mediul de afaceri*** a fost întreținută prin elaborarea de materiale informative: broșuri, pliante, site-ul [www.adrnord.md](http://www.adrnord.md), elaborarea materialelor video, publicații media, organizarea și desfășurarea de conferințe, prezentări, participarea la târguri și conferințe internaționale.

În vederea îmbunătățirii comunicării dintre APL și ADR Nord, Agenția a actualizat, ori de câte ori a organizat evenimente cu participarea APL, baza de date cu adresele electronice și a stăruit asupra eficienței comunicării prin intermediul poștei electronice și a altor canale electronice de comunicare.

### ***Asigurarea comunicării interne***

Pentru a asigura comunicarea eficientă a ADR Nord cu CRD Nord, ADR-urile și MDRC, s-au folosit următoarele instrumente: întruniri informative, prezentări, buletine informative electronice lunare, rapoarte anuale, vizite de studiu, întreținerea site-ului, publicații media.

Comunicarea dintre ADR Nord, ADR Centru și ADR Sud s-a realizat prin participarea la evenimente comune. Totodată, ADR-urile s-au informat reciproc și prin intermediul canalelor de comunicare proprii.

### ***Asigurarea transparenței în activitățile ADR Nord și a informării***

Un principiu de bază în activitatea ADR Nord a fost asigurarea transparenței în activitățile Agenției. În acest sens, sistematic, ADR Nord a depus maxim efort pentru a oferi publicului informații privind activitatea Agenției: comunicate de presă, note de presă, note informative, buletine informative, știri etc., toate fiind publicate pe site-ul [www.adrnord.md](http://www.adrnord.md), multe dintre acestea fiind republicate și pe site-urile [www.comunicate.md](http://www.comunicate.md), [www.civic.md](http://www.civic.md), [www.kontax.com](http://www.kontax.com). De asemenea, pe site-ul oficial al Agenției au fost date publicității rapoartele de activitate semestriale și anuale pentru anul 2011, decizii și procese-verbale din cadrul CRD Nord, precum și alte documente de interes public.

ADR Nord a organizat și a desfășurat evenimente comune cu mass-media, reprezentanții APL, membrii CRD Nord, membri ONG: un forum interregional, mese rotunde, conferințe, ateliere de lucru etc.

În acest sens, au fost organizate / elaborate:

- 3 conferințe de presă: (1) cu ocazia Forumului Economic Interregional Moldo-Român și cu ocazia lansării proiectelor (2) „Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărauca Veche” și (3) „Reabilitarea rețelei de drum public local (L-186) Pîrlița-Dumbrăveni-Vădeni-Florești, în lungime de 13,3 km”;
- Ziua ușilor deschise: cu ocazia Zilei Europei la Bălți;
- Editare pliante (1000 de exemplare) despre proiectele ADR Nord aflate în implementare în anul 2011;
- Elaborare materiale promoționale și informative în cadrul Forumului Economic Interregional Moldo-Român din 28-29 martie 2012 (pliante, pixuri, carnete, insigne, bannere, panouri informative etc.);
- 6 buletine electronice informative lunare, difuzate la peste 250 de abonați.

## V. Cooperarea cu partenerii de dezvoltare

### 5.1 Cooperare cu partenerii regionali de dezvoltare

ADR Nord a continuat colaborarea cu partenerii regionali de dezvoltare, societatea civilă, mass-media locală și regională, mediile de afaceri și academic.

Astfel: în colaborare cu:

- **ONG „CONTACT” Bălți** ADR Nord a organizat activități de dezvoltare a capacităților actorilor regionali din RDN și de promovare a parteneriatelor sociale
- Cu **ODIMM, ZEL Bălți, ADR Vest din România și alți parteneri din mediul de afaceri** ADR Nord a organizat, în premieră, la Bălți, Forumul Economic Interregional (eveniment descris la p. 4.1)
- Cu **Universitatea de Stat „A. Russo”** au fost organizate studii de cercetare:
  1. *Privind capacitatea APL din RDN de a planifica, atrage și gestiona investiții în domeniile prioritare SDR Nord;*
  2. *În cadrul Programului de stat „Managementul competitivității strategice a capitalului uman pe piața muncii a Republicii Moldova în condițiile dezvoltării regionale”, care se va solda cu o strategie regională privind capitalul uman.*
  3. *Privind situația actuală în domeniul AAC, managementul deșeurilor solide, situația economică și turism.*
- Cu **IDIS „Viitorul”,** în parteneriat cu **Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”** și **Asociația pentru Politică Externă,** a fost organizată o masă rotundă cu genericul „Disparitățile regionale în Republica Moldova – oportunități de îmbunătățire a cadrului legal și strategic” (eveniment descris la p. 4.1).

La 31 mai 2012, Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), reprezentată de directorul Ion BODRUG, și Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), reprezentată de directorul general Roman CHIRCA, au semnat, la Bălți, un Acord de colaborare în domeniul dezvoltării durabile a Regiunii de Dezvoltare Nord a R. Moldova.



Semnarea acordului de colaborare cu AITT

Acordul de colaborare s-a încheiat între cele două instituții în vederea realizării și dezvoltării de programe comune, specifice domeniului dezvoltării capacităților instituționale.

Detalii aici: <http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1342>.



## 5.2 Cooperare cu partenerii internaționali de dezvoltare

În perioada de raportare, ADR Nord a beneficiat de asistență tehnică din partea experților din Letonia (Ministerului Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale a Republicii Letonia) în cadrul proiectului bilateral *privind suportul ADR Nord la actualizarea documentelor de politici*. De asemenea, ADR Nord a beneficiat și de suportul consultativ din partea experților internaționali din cadrul proiectului Twinning „*Consolidarea capacităților în dezvoltarea regională în Republica Moldova*”.

Un rol aparte în dezvoltarea regională îi revine și Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), care a promovat activități în domeniul modernizării serviciilor comunale în RM, în procesul de dezvoltare a capacităților actorilor regionali și în procesul de elaborare și actualizare a planurilor de dezvoltare, precum și de oferire a suportului financiar și logistic la organizarea evenimentelor organizate de ADR Nord.

➤ Principalele domenii de cooperare ale ADR Nord și GIZ sînt:

### **1. Planificarea și programarea regională;**

În contextul extinderii proiectului MSPL, ADR Nord, cu suportul GIZ/ SIDA, a organizat un șir de activități privind elaborarea POR Nord 2013-2015, la capitolul planificarea și programarea regională strategică pentru fiecare program inclus în POR.

În rezultatul consultărilor și examinării conceptelor structurii noului POR, au fost elaborate propuneri privind structura actualizată a POR, fiind remise MDRC, care, împreună cu propunerile ADR Sud și ADR Centru, au servit în calitate de suport pentru stabilirea structurii POR 2013-2015.

În perioada semestrului I din 2012, a continuat procesul de actualizare a strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Rîșcani, componenta Apă și Canalizare. **Scopul procesului de actualizare a SDSE, componenta AAC**, este oferirea unei direcții clare de dezvoltare a serviciului AAC la nivel de raion pentru a asigura accesul populației la servicii calitative și accesibile de apă și calitate. **Metodologia** abordată este una inovațională pentru procesul de planificare la nivel local și presupune încadrarea priorităților naționale în sectorul aprovizionare cu apă și canalizare cu prioritățile locale în acest sector – priorități stabilite de comunitățile locale în mod participativ.

Pînă în momentul de față au fost realizați **următorii pași**:

- *Crearea consensului* la nivel local.
- *Stabilirea priorităților* naționale
- *Colectarea datelor* necesare
- *Etapa de analiză*
- *Discutarea opțiunilor*

- *Obiectivele specifice și Planul de acțiuni* pentru perioada 2012-2017  
Pașii care urmează:
- *Formularea componentei AAC a SDSE a raionului, definitivarea Planului de acțiuni și prezentarea proiectului SDSE actualizată Consiliului raional.*
- *Consultarea publică a documentului și aprobarea acestuia de către Consiliul raional.*
- *Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru clusterul prioritar, cu asistență din partea GIZ.*

În luna iunie 2012, în Regiunea Nord a fost dat startul campaniei de colectare a datelor în domeniile prioritare, în special în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice. Campania se desfășoară în baza chestionarelor elaborate de MDRC, GIZ și AEE în vederea includerii priorității *eficiența energetică a clădirilor publice* în strategiile de dezvoltare regională și elaborării unui Plan Național de Eficiență Energetică pe o perioadă de 3 ani. În cele 3 microregiuni ale RDN – Edineț, Bălți, Soroca – ADR și GIZ au organizat în comun câte o sesiune (în total 3 pe regiune) de informare și instruire a reprezentanților APL privind procesul de actualizare a SDRN și modalitatea de colectare a datelor / completarea chestionarelor pentru colectarea datelor necesare. Coordonarea distribuirii chestionarelor în teritorii, consultarea beneficiarilor privind completarea lor sînt realizate de către consultanții GIZ. Perioada de completare și colectare a chestionarelor este 26 iunie – 13 iulie, după care va urma procesarea datelor.

## ***2. Dezvoltarea competențelor APL în sporirea accesului la serviciile publice comunale***

Procesul de colaborare intermunicipală este susținut de proiectul MSPL prin activități de dezvoltare a capacităților actorilor locali în crearea și gestionarea eficientă a proiectelor de colaborare. În data de 19 aprilie 2012, în orașul Rîșcani, s-a desfășurat atelierul de lucru „Managementul proprietății publice în contextul cooperării intermunicipale”. Activitatea a urmărit scopul informării inițiale a primarilor privind colaborarea intermunicipală, la care au participat primarii din r-nul Rîșcani.

În scopul îmbunătățirii managementului ÎM „Apă-Canal Costești”, în proiectul ***„Aprovizionare cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche, comuna Costești, r-nul Rîșcani”*** s-a lucrat la elaborarea planului de afaceri al ÎM. În scopul identificării activităților de îmbunătățire a managementului ÎM, s-au organizat 2 ateliere de lucru. Activitățile au fost consultate de un expert în domeniul managementului operatorilor economici în AAC.

Pentru îmbunătățirea calității serviciului public în proiectul ***„Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărauca Veche”***, pe parcursul trimestrului I a fost oferită consultanță privind elaborarea documentelor necesare pentru înregistrarea și lansarea activității ÎM, care va presta și servicii de iluminare stradală.

Experții GOPA au oferit consultanță privind genurile de activitate a întreprinderii municipale nou formate din Tătărauca Veche.

Un factor important, care poate influența durabilitatea acestui proiect este perceperea de către populația de orice vârstă a obiectivelor și scopurilor proiectului, care urmează să fie implementat. Astfel, au fost informați elevii și profesorii gimnaziului din sat.

Pe pagina web a ADR Nord și în buletinul informativ, în ziarul local „Observatorul de Nord” (raionul Soroca) au fost publicate informații privind activitățile și progresul proiectului.

### ***3. Implementarea proiectelor investiționale***

Activitățile de implementare a proiectului „*Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărauca Veche*” se află la etapa de așteptare a realizării proiectului tehnic de execuție. S-a constatat că, pentru elaborarea proiectului de execuție, sînt necesare ridicările topografice și prospecțiunile geodezice, pentru care nu au fost prevăzute surse de finanțare la etapa inițială.

Ca rezultat, conducerea GIZ a luat decizia ca serviciile de proiectare să fie finanțate din sursele GIZ.

În prezent, sîntem la etapa de executare a lucrărilor de ridicare topografică, a prospecțiunilor geodezice și a proiectului tehnic privind sistemul de iluminare stradală în comuna Tătărauca Veche.

În afară de aceasta, pe parcursul trimestrului I din 2012, au fost realizate următoarele activități prevăzute în planul de implementare a proiectului:

1. În luna martie 2012 s-a elaborat caietul de sarcini pentru anunțarea licitației de selectare a companiei de proiectare și execuție a ridicărilor topografice, prospecțiunilor geodezice și proiectului tehnic.
2. În data de 20.03.2012 s-a desfășurat licitația de selectare a companiei de proiectare și execuție a ridicărilor topografice, prospecțiunilor geodezice și proiectului tehnic.
3. Evaluarea ofertelor a avut loc în data de 22.03.2012. În urma evaluării ofertelor, a fost selectată compania de proiectare și execuție a ridicărilor topografice, prospecțiunilor geodezice și proiectului tehnic – ÎM „Biroul de arhitectură și sistematizare” din mun. Bălți.
4. În data de 29.03.2012, GIZ a semnat contractul cu compania de proiectare.
5. Proiectul tehnic cu ridicările topografice și prospecțiunile geodezice a fost finalizat și verificat de către Serviciul pentru Expertizarea și Verificarea Proiectelor și Construcțiilor, actul de verificare și expertiză tehnică a fost emis în data de 29.06.2012.

La sfîrșitul lunii martie au fost reluate ***activitățile de construcție a sistemului de apă și canalizare din s. Duruitoarea Veche, comuna Costești, r-nul Rîșcani.*** În această perioadă s-au



definitivat lucrările de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă cu lungimea totală de 7,6 km, inclusiv 2,5 km aducțiune. S-au început lucrările de construcție a sistemului de canalizare.

În cadrul executării lucrărilor de construcții, operatorul economic SRL „VALIS” a depistat necesitatea efectuării unor lucrări adăugătoare, ce nu au fost incluse, la etapa inițială, în documentația tehnică de proiect. Astfel, ADR Nord, instituția responsabilă de implementarea proiectului, a remis către autorul de proiect „BONCOM PROIECT” un demers, prin care a solicitat efectuarea modificărilor necesare și prezentarea unui deviz de cheltuieli pentru volumul de lucrări suplimentare. Au fost efectuate 15 vizite de monitorizare, inclusiv 5 vizite de monitorizare cu participarea expertului tehnic. S-au examinat, în teren, unele dificultăți de ordin tehnic. Au fost organizate 2 ședințe cu participarea operatorului economic, a autorului de proiect și reprezentanților ADR, unde s-au discutat modificările necesare la proiectul tehnic. La momentul actual se efectuează modificări în proiectul de execuție la capitolul „*Conectarea stației de pompă nr. 2 la energia electrică*”. Din motivul unor greșeli comise la elaborarea proiectului, termenul de construcție a sistemului de canalizare se prelungește.

Construcția sistemului de aprovizionare cu apă este terminată. S-a făcut un demers către autorul de proiect de a diviza lucrările de construcție în 2 etape pentru a permite furnizarea apei potabile cât mai curînd posibil. În luna iunie s-au efectuat lucrările de conectare a gospodăriilor la sistemul de aprovizionare cu apă. Furnizarea apei va începe imediat după încheierea actului de terminare a lucrărilor.

Proiectul de execuție pentru renovarea stației de epurare Costești a fost ridicat de la Serviciul de Stat de Verificare a proiectelor și construcțiilor. Pentru atragerea surselor financiare, Primăria Costești a depus un proiect investițional la Programul Operațional România-Ucraina-Moldova.

### **5.3 Cooperarea transfrontalieră**

#### ***Dezvoltarea parteneriatelor intercomunitare și transfrontaliere***

În perioada lunii ianuarie 2012, ADR Nord a inițiat relații de parteneriat cu Asociația „Euroconcept”, Botoșani, România; Agenția pentru Dezvoltare Economică și Cooperarea Transfrontalieră din regiunea Novoselița, Ucraina, și Asociația Obștească „CUTEZĂTORUL” din or. Fălești, R. Moldova, în cadrul Programului Operațional Comun 2007-2013 (POC 2007-2013). În cooperare cu acești parteneri a fost elaborată și depusă NC „Creșterea capacității privind dezvoltarea regională și cooperarea transfrontalieră”, care a fost depusă în cadrul POC 2007-2013, urmînd ca scop îmbunătățirea situației socio-economice în RDN.

Un alt concept de proiect depus în cadrul POC 2007-2013 în domeniul Eficiență Energetică, „*Promovarea experienței transfrontaliere în domeniul eficienței energetice la nivel local și regional*”, a fost elaborat și depus de ADR Nord în parteneriat cu Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) din R. Moldova; Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă,

Iași, România, și Organizația publică „Agenția de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană”, din Euroregiunea Dunărea de Jos, or. Izmail, regiunea Odesa, Ucraina.

Menționăm că, în perioada raportării, ambele concepte de proiecte sînt la etapa de evaluare.

Tot în perioada anului 2012, APL Corjeuți, r-nul Briceni, a fost asistat în elaborarea NC „**Construcția edificiului Liceului din s. Corjeuți, r-nul Briceni**” pentru programul finanțat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAE IE).

Conceptul subproiectului ADR Nord „Consolidarea capacităților pentru actorii regionali (Regiunea Nord a R. Moldova) în domeniul eficienței energetice, prin transferul transnațional de practici de succes”, deus în cadrul programului SEE în cooperare cu ADR Vest, este la etapa de evaluare și doar în luna septembrie vom cunoaște rezultatele evaluării.

#### **5.4 Schimb de experiență internațională**

Pe parcursul semestrului I din 2012, colaboratorii ADR Nord au avut posibilitate să efectueze vizite de studiu peste hotarele țării:

1. *Participarea la Conferința „Dezvoltarea regională în Europa de Sud-Est, pro și contra” 8-10.03.2012, Cluj-Napoca, România*

În cadrul conferinței au fost prezentate studii de caz, politici publice, articole pe această temă din țările participante. De asemenea, s-a vorbit despre cum s-a dezvoltat regionalizarea în statele europene, despre transparența formării bugetului și cheltuielilor banilor publici în administrațiile publice locale. Reprezentanții statelor europene cu o mai bogată experiență și-au prezentat viziunea în privința politicilor de dezvoltare regională pentru perioada 2010-2014.

2. *Seminar cu tematica „Informație – Mesaj – Atitudine”, 05.04-08.04.12, Poiana Brașov, România*

Participanții la seminar au abordat subiecte de actualitate privind situația din Republica Moldova și România. Unul dintre rezultatele pozitive ale seminarului a fost stabilirea de contacte de comunicare între participanți, fapt care reprezintă o excelentă posibilitate de a promova activitățile și imaginea ADR Nord prin intermediul blogurilor și altor canale de comunicare.

3. *Vizită de studiu în Estonia și Finlanda, 21-25.05.2012*

Vizita de studiu în Estonia și Finlanda a fost binevenită pentru specialiștii delegați, care au contribuit esențial la creșterea abilităților profesionale în domeniul dezvoltării regionale. Bunele practici privind armonizarea politicilor de dezvoltare regională a statelor Estonia și Finlanda, împreună cu cadrul legal și instituțional al UE, vor facilita procesul de integrare europeană a Moldovei. Este necesară continuitatea relațiilor de colaborare cu instituții similare din țările membre ale Uniunii Europene pentru inițierea de programe și proiecte în domeniul dezvoltării regionale.

4. *Vizita de studiu în Republica Federală Germană, cu scopul participării în cadrul Forumului „GREEN VENTURES 2012”, 13-16.06.2012*

În cadrul acestei vizite, specialistul ADR Nord a avut posibilitate să se familiarizeze cu:

- Producerea energiei electrice cu ajutorul panourilor solare fotovoltaice;
- Importanța clasificatorului clădirilor publice în domeniul EE;
- Cunoștințe privind procesele și tehnologiile inovative de producere a energiei electrice prin incinerarea deșeurilor menajere;
- Procesul de colectare și selectare a deșeurilor;
- Metode de atragere a investițiilor;
- Importanța participării la activități organizate la nivel atât național cât și internațional (Forumuri, ateliere de lucru, seminare, întâlniri oficiale etc.)
- Importanța relațiilor de parteneriat în soluționarea problemelor privind dezvoltarea regională.

## VI. Activitatea operațională a ADR Nord

### 6.1 Implementarea planului de achiziții al ADR Nord în semestrul I din 2012

#### *Achizițiile publice pentru proiecte*

În perioada 1 ianuarie – 1 iulie 2012, grupul de lucru pe achiziții al ADR Nord a îndeplinit următoarele activități pentru proiectele aprobate spre finanțare:

- Încheierea a două acorduri adiționale la lucrări adăugătoare neprevăzute la drumurile de la ZEL Bălți și drumul M-14 prin or. Edineț. De asemenea, au fost încheiate acorduri adiționale pentru majorarea sumelor la contractele cu responsabilii tehnici și autorii la proiectele sus-menționate.
- Contractarea operatorului economic pentru execuția lucrărilor la porțiunea de drum din r-nul Soroca.
- Înregistrarea contractului de achiziție a serviciilor de proiectare a construcțiilor de salubritate în r-nul Soroca.
- Încheierea contractului cu proiectantul reparațiilor la incubatorul de afaceri din com. Larga
- Rezilierea contractului cu SRL „Geocorp”, antreprenor care nu s-a isprăvit cu execuția lucrărilor de construcție a 51 platforme la proiectul de salubritate din Biruința.
- Transmiterea stației de tratare a apei din or. Fălești, cu asigurarea garantării funcționării acesteia din partea Consiliului raional Fălești.
- Atribuirea contractului de execuție a lucrărilor pentru 31 platforme la proiectul de salubritate din Biruința.
- Încheierea contractului pentru servicii de verificare a proiectului tehnic a canalizării din or. Otaci.

#### *Achiziții publice pentru Agenție:*

- Elaborarea și aprobarea planului de achiziție unic pe necesitățile agenției și a proiectelor în bunuri servicii și lucrări.
- Transferul site-ului ADR Nord la un alt serviciu de hosting.
- Achiziționarea serviciilor de deservire a conturilor operaționale și a proiectelor Agenției într-o bancă comercială.
- Semnarea contractului pentru deservirea tehnicii operaționale ale Agenției.
- Contractarea serviciilor de furnizare a articolelor de papetărie și a rechizitelor de birou pentru Agenție.
- Contractarea serviciilor de catering pentru organizarea evenimentelor și activităților promovate de Agenție.

- Achiziționarea combustibilului pentru autoturismul Agenției.

## 6.2 Implementarea planului de finanțare al ADR Nord în semestrul I din 2012

Pentru anul 2012 a fost elaborat planul anual de finanțare al ADR Nord, ce include procurări de bunuri și servicii necesare pentru realizarea obiectivelor trasate.

Executarea bugetului de către ADR Nord în semestrul I din 2012 s-a desfășurat în modul următor:

- Din FNDR au fost preconizate 2520.4 mii lei, pentru cheltuieli operaționale, dintre care pentru:
  - retribuirea muncii și contribuții de asigurări de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală: - 1762.9 mii lei;
  - plata mărfurilor și a serviciilor: - 395.4 mii lei;
  - deplasări în interes de serviciu: - 38.0 mii lei.

La finele perioadei raportate, din mijloacele FNDR, în semestrul I din 2012 s-au valorificat 961,6 mii de lei, ceea ce prezintă 58.6 % din suma de 1642.4 mii lei, planificata pentru semestrul I.

La sfârșitul perioadei de referință, ADR Nord a format datorii creditoare la capitolul cheltuieli organizaționale ale ADR în mărime de 109.9 mii lei.

Astfel, datoriile la retribuirea muncii constituie – 93.6 mii lei, contribuțiile de asigurări de stat obligatorii – 21.5 mii lei. Aceasta se datorează faptului că plata salariului colaboratorilor se efectuează la data de „1” a lunii următoare, celei pentru care a fost calculat salariul. De asemenea, plata serviciilor se efectuează în luna imediat următoare. După luna în care acestea au fost prestate, serviciile și facturile fiscale sînt prezentate de către prestatorii de servicii după data de 10-15 a lunii următoare, după prestarea serviciului.

De asemenea, plata serviciilor se efectuează în luna imediat următoare, după luna în care acestea au fost prestate.

În vederea valorificării proiectelor aprobate spre finanțare în 2012, în prima jumătate de an, de la MDRC, au fost primite mijloace bănești în mărime de 11308167,30 lei, inclusiv pentru proiectele cu următoarele coduri:

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| ➤ 9216 – 1 984.91 lei     | ➤ 9893 – 835 150,00 lei   |
| ➤ 9666 – 2 085 026.46 lei | ➤ 9223 – 6 226 698,34 lei |
| ➤ 9222 – 2 159 307.59 lei |                           |

În data de 30 iunie 2012, ADR Nord are datorii creditoare față de operatorii economici care efectuează lucrări și servicii în cadrul proiectelor în mărime de 11069064,44 lei, dintre care 7505045,94 lei au fost achitate pînă la data de 4 iulie 2012, deoarece finanțarea în iunie a intrat în contul bancar al Agenției la sfârșitul zilei de 29 iunie 2012, ceea ce a făcut imposibil transferul pînă la finele lunii.

## CONCLUZII

Semestrul I din 2012 a fost o perioadă fructuoasă pentru activitatea ADR Nord. Activitățile desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivelor dezvoltării regionale au reieșit din prevederile în vigoare ale cadrului legislativ al Republicii Moldova privind dezvoltarea regională.

În comparație cu perioada similară a anului trecut, a crescut simțitor nivelul de profesionalism al colaboratorilor ADR Nord, calitatea activităților organizate și a nivelului de implementare a proiectelor.

De asemenea, APL din RDN s-au manifestat mai activ vizavi de activitatea Agenției, fiind stabilite relații favorabile de conlucrare cu președinții de raioane, primarii, precum și cu membrii CRD Nord.
